METROPOLITANA MILANESE

ID	Nome attività	Durata
1	**CREAZIONE DI CENTRO CALCIO CAMPO A 7 - CAMPO A 5**	**60 g**
2	INIZIO LAVORI	0 g
3	Cantierizzazione	1 g
4	**RIMOZIONI E DEMOLIZIONI**	**12 g**
5	Rimozione attrezzi sportivi	1 g
6	Rimozione manto in erba artificiale	3 g
7	Rimozione pali illuminazione e sfilaggio cavi	3 g
8	Demolizione pavimentazioni	3 g
9	Rimozione recinzione esistente	3 g
10	**OPERE CIVILI**	**28 g**
11	Scavi a sezione obbligata	5 g
12	Scavo Pozzi e posa tubi in cls	4 g
13	Fondazioni e cordolo recinzione	10 g
14	Rinterri	2 g
15	Opere in c.a.	3 g
16	Posa pozzetti	2 g
17	Rinterri	4 g
18	**IMPIANTI ELETTRICI**	**14 g**
19	Posa corrugati	4 g
20	Quadri, collegamenti e messa a terra	3 g
21	Posa pali illuminazione e proiettori	10 g
22	**OPERE EDILI**	**22 g**
23	Posa Recinzione	9 g
24	Pavimentazione autobloccanti	1 g
25	Drenaggi	6 g
26	Posa tappeto erboso	9 g
27	Segnature aree da gioco	2 g
28	Posa porte da calcio	1 g
29	**SMOBILIZZO CANTIERE**	**1 g**
30	Rimozione recinzione, baracche e wc	1 g
31	**FINE LAVORI**	0 g
32		

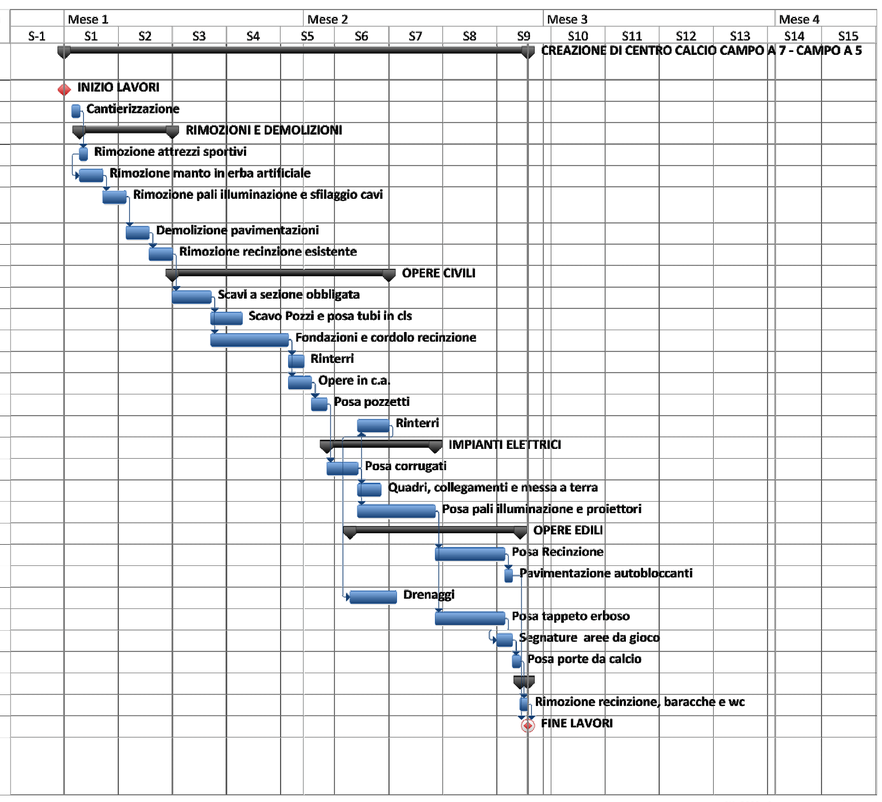

CH_0009 Cronoprogramma dei lavori
Data: Giugno 2013

MILANOSPORT

RIFACIMENTO CAMPO DA CALCIO A 11 E RUGBY

METROPOLITANA MILANESE SPA

IL DIRETTORE TECNICO
Ing. Dario Comini
Ordine degli Ingegneri di Lecco n° 304

IL PROGETTISTA RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE FRA LE VARIE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
DOTT. ING. Corrado Bina
Ordine degli Ingegneri Monza e Brianza n° 1078

IL coordinatore in fase di progettazione
DOTT. ING. DARIO COMINI
Ordine degli Ingegneri di Lecco n° 304

Aggior.	Data	Descrizione	Disegnato	Progettato	Verificato	Acquisito	Approvato
1	GIUG.2013	CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI					
0	24/06/2013	EMISSIONE		E.Marino	S.Solinas	C. Bina	D.Comini

Collaborazione alla progettazione TIPOPROG
RR.

Scala grafica

AZIENDA CON SISTEMA QUALITA' UNI EN ISO 9001 CERTIFICATO DA ICMQ
Certificato N. 96595 Organismo di progettazione Attività di Progettazione e Coordinamento nei settori di specializzazione relativi a Linee Metropolitane, Ferroviarie e Tramviarie urbane ed extraurbane; Viabilità urbana ed extraurbana; Parcheggi e Strutture di Interscambio; Opere Idrauliche, Acquedotti e Fognature; Risistemazione del territorio e Bonifiche; Interventi Edilizi, Aeroestaziori e Manufatti Aeroportuali. Gestione del processo costruttivo. Direzione, Coordinamento e Supervisione Lavori.
Certificato N. 00436 Esperimento Gare d'Appalto/Appaltanti Lavori e forniture in conformità alle disposizioni di legge della Repubblica Italiana.

METROPOLITANA MILANESE SPA

E' vietata la riproduzione di questo documento senza la preventiva autorizzazione di MM SpA

Titolo

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Sostituisce	Dimensioni (mm)	Scala	Commessa	Lotto	Fase	Cat.	Opera	Progressivo	Foglio
_	-		CH	1	SI	G	_	0009	1
Sostituito da: _									
